

# STADE FOR IGANGVÆRENDE LEDNINGSARBEJDER

- I KILDEGADE OG TILSTØDENDE GADER

Dato: 31. august 2023  
Projekt navn: Kildegade m.fl., Nibe - Separatkloakering  
Projekt nr.: 1223310  
Udarbejdet af: Mads Frandsen, Envidan A/S  
Modtager: Nibe Samråd  
Side: 1 af 2

## Orientering om projektets fremdrift august 2023

Vi skriver udgangen af August, og vi er et godt stykke forbi sommerferieperioden. Dette betyder at Nibe Varmeværk A.m.b.a. og dennes underentreprenør; Nibe Entreprenør & Transport A/S har haft godt travlt med at forny fjernvarmeledninger i Kildegade, og det varer således ikke længe før, at deres del af projektet forventes afsluttet.

Aalborg Vand's og Aalborg Kloak's tilknyttede entreprenør; A/S Mortensen & Nymark, har ligeledes været at finde på lokaliteten i denne måned. Denne har haft travlt med at etablere borer til overvågning af grundvandsstanden i området, forud for de forestående kloakarbejder og den nødvendige grundvandssænkning, som her skal foretages.

Ligeledes er man ved at udføre forsøg med sænkning af grundvandet, som skal sikre korrekt indstilling af grundvandssænkingsanlægget, inden gravearbejderne igangsættes.

Entreprenør går så småt i gang med at grave for Aalborg Vands nye hovedledning i Koldsmindevej i udgangen af uge 35, og der forventes at blive startet op på kloakarbejderne i starten af uge 37 i sammen område.

fremadrettet vil der blive fremsendt lignende månedlige opdateringer på projektets fremdrift.

Jeg har vedhæftet stadekort, til at give overblik over hvilke ledningsarbejder, der er afsluttet, og hvilke der er planlagt i det videre projektførløb-


Med venlig hilsen

EnviDan A/S

Mads Frandsen



Stadekort pr. 31. august 2023

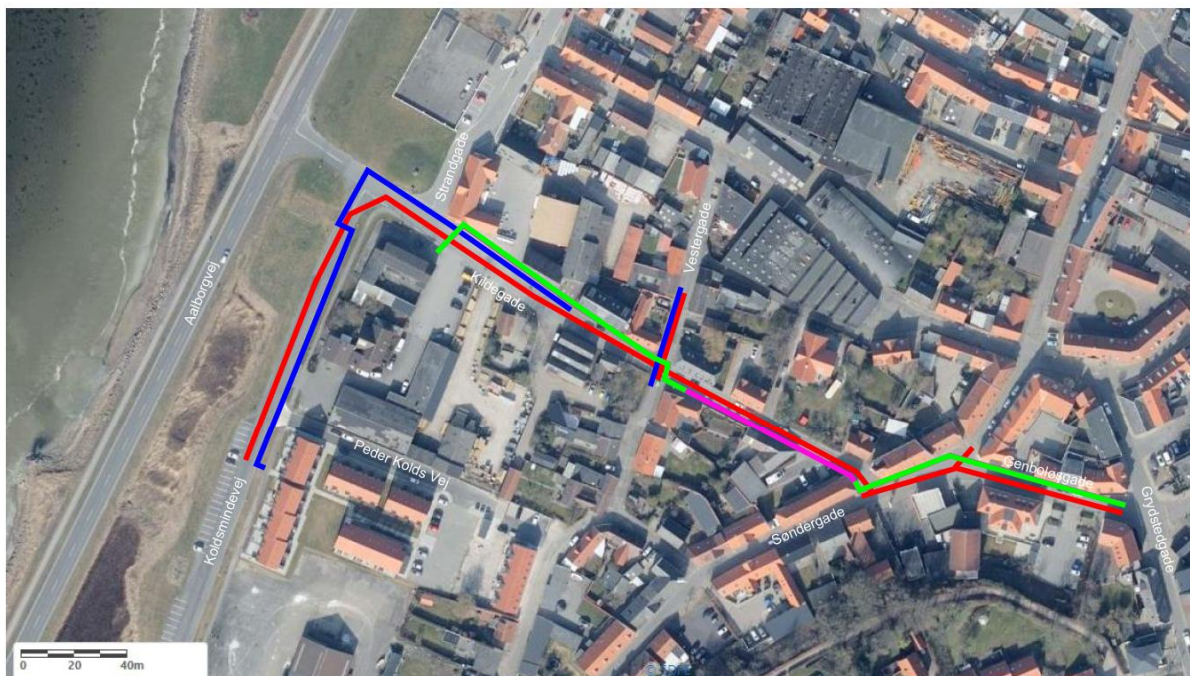

Ledningsejere	
	Projekteret anlæg Aalborg Kloak A/S
	Projekteret anlæg Aalborg Vand A/S
	Projekteret anlæg Nibe Varmeværk A.m.b.a.
	Udført anlæg
