

# STADE FOR IGANGVÆRENDE LEDNINGSARBEJDER

- I KILDEGADE OG TILSTØDENDE GADER

Dato: 13. januar 2024  
Projekt navn: Kildegade m.fl., Nibe - Separatkloakering  
Projekt nr.: 1223310  
Udarbejdet af: Mads Frandsen, Envidan A/S  
Modtager: Nibe Samråd  
Side: 1 af 2

## Orientering om projektets fremdrift medio januar 2024

Inden juleferien, blev der udlagt asfalt på Koldsmindevej og den nedre del af Kildegade, som følge af at kloakarbejderne her er blevet afsluttet. I samme ombæring blev der udlagt et tyndere lag asfalt på den øvre del af Kildegade. Sidstnævnte blev gjort for at sikre farbarheden i dette område, indtil kloakarbejderne når hertil. Der er således ikke tale om et blivende lag asfalt på denne del af Kildegade.

Entreprenør skulle efter tidsplanen for entreprisen, have været i fuld sving med det videre lægningsarbejde for Aalborg Kloak A/S, men Kong Vinter har desværre gjort sit indtog i et sådant omfang, at opstarten er blevet udskudt. Hvornår opstarten så bliver, er for nuværende, endnu for tidligt at melde noget ud om, men kravet er at vi skal ind i en periode med dags temperaturer over frysepunktet.

Begrundelsen for dette er, at der er behov for at grundvandssænke i det pågældende område, i forbindelse med etablering af det nye kloakanlæg. Der er i forbindelse med dette forbundet en stor risiko for, at den hårde frost giver hyppige problemer, hvor slangerne til håndtering af grundvandet fryser til. Dertil kommer at den længerevarende periode vi nu er i med dagsfrost, gør at der dannes iskrystaller i det materiale entreprenøren skal genopbygge vejen med. Det er således ikke muligt at opnå tilstrækkelig komprimering, og dermed ordentlig opbygning, hvis materialet er frosset.

Vedhæftet finder I stadekort, som giver overblik over ledningsarbejdernes foreløbige fremdrift, samt hvilke arealer, der er blevet asfalteret jf. ovenstående. Der er ikke sket meget siden sidst, og jeg håber at næste orientering bringer mere fremdrift med sig.

Med venlig hilsen


Envidan A/S  
Mads Frandsen

### Bilag

- Stadekort d. 13.01.2024



Stadekort pr. 13. januar 2024

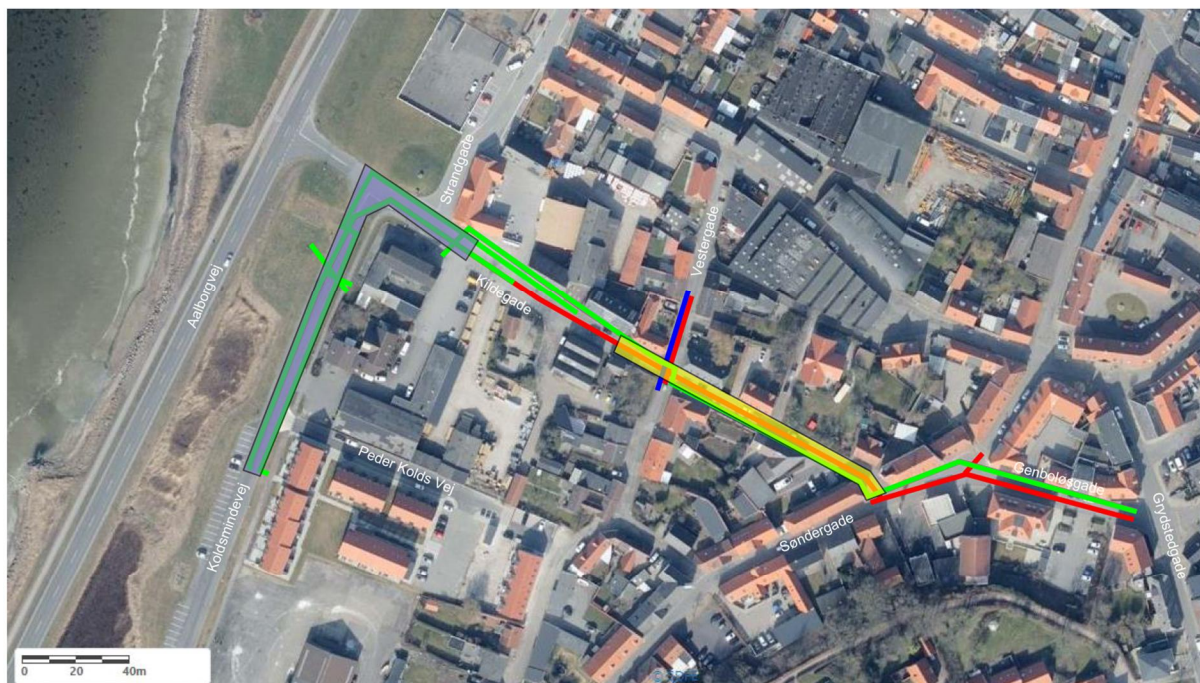

Ledningsejere		Asfaltering	
<span style="color: red;">—</span>	Projekteret anlæg Aalborg Kloak A/S	<span style="background-color: purple; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Udlagt bærelag (asfalt)
<span style="color: blue;">—</span>	Projekteret anlæg Aalborg Vand A/S	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	Udlagt midlertidigt asfalt
<span style="color: magenta;">—</span>	Projekteret anlæg Nibe Varmeværk A.m.b.a.		
<span style="color: green;">—</span>	Udført anlæg		
